

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021

PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2021		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
1	29496	C-SOP-001/2021	TAMPICO	ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE YUGOSLAVIA ENTRE AVE. MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$3,487,782.60	\$3,487,782.60	01/02/2021	11/04/2021	M2	1,806.61	HABITANTES	86	100.00%	92.10%	\$3,212,180.43	
2	29832	C-SOP-001/2021	TAMPICO	ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE YUGOSLAVIA ENTRE AVE. MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$314,581.76	\$314,581.76	01/02/2021	11/04/2021	ML	193.50	HABITANTES	86	100.00%	99.26%	\$312,255.82	
3	32793	C-SOP-002/2021	TAMPICO	ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO	\$178,359.58	\$178,359.58	25/01/2021	04/04/2021	ML	84.60	HABITANTES	48	100.00%	113.07%	\$201,663.85	
4	34623	C-SOP-002/2021	TAMPICO	ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO	\$424,859.16	\$424,859.16	25/01/2021	04/04/2021	ML	84.60	HABITANTES	48	100.00%	105.91%	\$449,974.90	
5	34727	C-SOP-002/2021	TAMPICO	ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO	\$1,163,506.47	\$1,163,506.47	25/01/2021	04/04/2021	M2	604.04	HABITANTES	48	100.00%	95.41%	\$1,110,124.59	
6	41501	C-SOP-002/2021	TAMPICO	ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS COL SANTO NIÑO	\$135,128.69	\$135,128.69	25/01/2021	04/04/2021	ML	84.60	HABITANTES	48	100.00%	95.27%	\$128,734.85	
7	47175	C-SOP-003/2021	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVE LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO	\$212,347.31	\$212,347.31	28/01/2021	07/04/2021	ML	104.90	HABITANTES	72	100.00%	93.52%	\$198,580.08	
8	47461	C-SOP-003/2021	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVE LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO	\$499,310.60	\$499,310.60	28/01/2021	07/04/2021	ML	104.90	HABITANTES	72	100.00%	106.26%	\$530,555.43	
9	50762	C-SOP-003/2021	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVE LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO	\$1,522,152.20	\$1,522,152.20	28/01/2021	07/04/2021	M2	936.64	HABITANTES	72	100.00%	98.26%	\$1,495,707.12	
10	51003	C-SOP-003/2021	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE B ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y AVE LAS TORRES COL FERNANDO SAN PEDRO	\$172,883.11	\$172,883.11	28/01/2021	07/04/2021	ML	104.90	HABITANTES	72	100.00%	98.87%	\$170,925.14	
11	54069	C-SOP-004/2021	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA	\$185,752.90	\$185,752.90	01/02/2021	11/04/2021	ML	140.00	HABITANTES	114	100.00%	144.17%	\$267,801.17	
12	54807	C-SOP-004/2021	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA	\$658,510.93	\$658,510.93	01/02/2021	11/04/2021	ML	140.00	HABITANTES	114	100.00%	87.29%	\$574,833.46	
13	56723	C-SOP-004/2021	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA	\$2,447,740.41	\$2,447,740.41	01/02/2021	11/04/2021	M2	1,285.20	HABITANTES	114	100.00%	80.44%	\$1,968,960.45	
14	56767	C-SOP-004/2021	TAMPICO	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV AZUCARERA ENTRE TAMAULIPAS Y AGUASCALIENTES COL GUADALUPE VICTORIA	\$207,662.64	\$207,662.64	01/02/2021	11/04/2021	ML	140.00	HABITANTES	114	100.00%	95.92%	\$199,193.32	
15	56922	C-SOP-005/2021	TAMPICO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$198,027.46	\$198,027.46	08/02/2021	18/04/2021	ML	108.60	HABITANTES	72	100.00%	115.92%	\$229,563.28	

RAMO 033  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021

PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2021		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
16	58641	C-SOP-005/2021	TAMPICO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$498,703.40	\$498,703.40	08/02/2021	18/04/2021	ML	108.60	HABITANTES	72	100.00%	85.92%	\$428,502.51	
17	60089	C-SOP-005/2021	TAMPICO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$1,360,629.06	\$1,360,629.06	08/02/2021	18/04/2021	M2	742.17	HABITANTES	72	100.00%	97.74%	\$1,329,817.46	
18	60368	C-SOP-005/2021	TAMPICO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE ESTERO ENTRE GUSTAVO GONZALEZ Y AV LAS TORRES COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$162,790.39	\$162,790.39	08/02/2021	18/04/2021	ML	108.60	HABITANTES	72	100.00%	95.60%	\$155,628.28	
19	61510	C-SOP-012/2021	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES	\$168,521.47	\$168,521.47	26/02/2021	06/05/2021	ML	127.10	HABITANTES	17	100.00%	126.99%	\$214,000.65	
20	62314	C-SOP-012/2021	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES	\$611,273.86	\$611,273.86	26/02/2021	06/05/2021	ML	127.10	HABITANTES	17	100.00%	85.40%	\$522,051.72	
21	62339	C-SOP-012/2021	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES	\$1,410,469.73	\$1,410,469.73	26/02/2021	06/05/2021	M2	777.85	HABITANTES	17	100.00%	98.30%	\$1,386,498.88	
22	62354	C-SOP-012/2021	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE CARPINTERO ENTRE PIPILA Y GOLFO DE MEXICO COL NIÑOS HEROES	\$207,686.06	\$207,686.06	26/02/2021	06/05/2021	ML	127.10	HABITANTES	17	100.00%	97.20%	\$201,863.81	
23	62372	C-SOP-013/2021	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$294,205.65	\$294,205.65	26/02/2021	26/05/2021	ML	185.50	HABITANTES	102	100.00%	105.79%	\$311,254.54	
24	62468	C-SOP-013/2021	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$574,043.09	\$574,043.09	26/02/2021	26/05/2021	ML	185.50	HABITANTES	102	100.00%	123.76%	\$710,439.33	
25	62513	C-SOP-013/2021	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$2,742,887.56	\$2,742,887.56	26/02/2021	26/05/2021	M2	1,702.89	HABITANTES	102	100.00%	113.84%	\$3,122,383.18	
26	62535	C-SOP-013/2021	TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE B ENTRE CALLE 10 Y DREN PLUVIAL COL ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	\$348,693.16	\$348,693.16	26/02/2021	26/05/2021	ML	185.50	HABITANTES	102	100.00%	100.08%	\$348,954.77	
27	62567	C-SOP-014/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE PIPILA ENTRE ANTIGUO CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES	\$93,423.95	\$93,423.95	26/02/2021	06/05/2021	MLL	71.00	HABITANTES	53	100.00%	101.74%	\$95,051.94	
28	62599	C-SOP-014/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE PIPILA ENTRE ANTIGUO CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES	\$416,495.19	\$416,495.19	26/02/2021	06/05/2021	ML	71.00	HABITANTES	53	100.00%	85.94%	\$357,948.36	
29	62634	C-SOP-014/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PIPILA ENTRE ANTIGUO CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES	\$1,045,937.04	\$1,045,937.04	26/02/2021	06/05/2021	M2	543.15	HABITANTES	53	100.00%	106.14%	\$1,110,179.83	
30	62662	C-SOP-014/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE PIPILA ENTRE ANTIGUO CAMINO VIEJO A TANCOL Y CARPINTERO COL NIÑOS HEROES	\$98,288.57	\$98,288.57	26/02/2021	06/05/2021	ML	71.00	HABITANTES	53	100.00%	92.26%	\$90,577.28	

RAMO 033  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021


PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

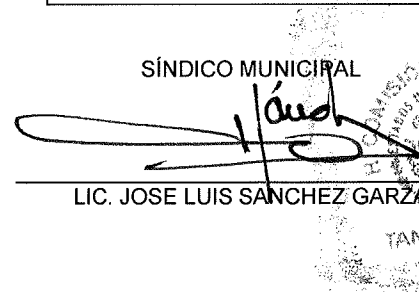
No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2021		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
31	77472	C-SOP-015/2021	TAMPICO	OCTAVIO MARTINEZ REYES	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PROL CLAVEL ENTRE AV TANCOLY MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES	\$124,104.76	\$124,104.76	05/03/2021	13/05/2021	ML	131.60	HABITANTES	69	100.00%	76.81%	\$95,321.52	
32	77882	C-SOP-015/2021	TAMPICO	OCTAVIO MARTINEZ REYES	DRENAJE SANITARIO DE PROL CLAVEL ENTRE AV TANCOLY MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES	\$593,374.29	\$593,374.29	05/03/2021	13/05/2021	ML	131.60	HABITANTES	69	100.00%	79.73%	\$473,079.59	
33	78527	C-SOP-015/2021	TAMPICO	OCTAVIO MARTINEZ REYES	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PROL CLAVEL ENTRE AV TANCOLY MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES	\$1,406,230.76	\$1,406,230.76	05/03/2021	13/05/2021	M2	688.00	HABITANTES	69	100.00%	100.13%	\$1,408,115.54	
34	78561	C-SOP-015/2021	TAMPICO	OCTAVIO MARTINEZ REYES	ALUMBRADO PUBLICO DE PROL CLAVEL ENTRE AV TANCOLY MARGEN DEL RIO TAMESI COL PESCADORES	\$211,025.66	\$211,025.66	05/03/2021	13/05/2021	ML	131.60	HABITANTES	69	100.00%	94.87%	\$200,210.42	
35	79373	C-SOP-016/2021	TAMPICO	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS	\$496,740.94	\$496,740.94	05/03/2021	02/06/2021	ML	144.40	HABITANTES	60	100.00%	181.06%	\$899,421.24	
36	81331	C-SOP-016/2021	TAMPICO	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS	\$657,395.75	\$657,395.75	05/03/2021	02/06/2021	ML	144.40	HABITANTES	60	100.00%	77.17%	\$507,327.24	
37	81371	C-SOP-016/2021	TAMPICO	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS	\$1,831,803.48	\$1,831,803.48	05/03/2021	02/06/2021	M2	1,096.53	HABITANTES	60	100.00%	0.00%	\$0.00	
38	81979	C-SOP-016/2021	TAMPICO	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE ALDAMA Y DERECHO DE VIA PUENTE TAMPICO COL TAMAULIPAS	\$169,854.52	\$169,854.52	05/03/2021	02/06/2021	ML	144.40	HABITANTES	60	100.00%	0.00%	\$0.00	
39	82331	C-SOP-021/2021	TAMPICO	CEPISA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE ESTERO ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$75,566.77	\$75,566.77	15/03/2021	02/06/2021	ML	78.00	HABITANTES	51	100.00%	151.28%	\$114,320.74	
40	82494	C-SOP-021/2021	TAMPICO	CEPISA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	DRENAJE SANITARIO DE CALLE ESTERO ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$261,113.76	\$261,113.76	15/03/2021	02/06/2021	ML	78.00	HABITANTES	51	100.00%	78.61%	\$205,271.74	
41	82518	C-SOP-021/2021	TAMPICO	CEPISA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ESTERO ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$735,323.30	\$735,323.30	15/03/2021	02/06/2021	M2	397.80	HABITANTES	51	100.00%	94.88%	\$697,668.85	
42	82572	C-SOP-021/2021	TAMPICO	CEPISA CONSTRUCTORA S.A DE C.V	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE ESTERO ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO	\$112,450.61	\$112,450.61	15/03/2021	02/06/2021	ML	78.00	HABITANTES	51	100.00%	113.08%	\$127,163.13	
43	82590	C-SOP-022/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV LA PAZ ENTRE DR. A MATIENZO Y DR. ALFONSO G ALARCON ZONA CENTRO	\$277,341.84	\$277,341.84	29/03/2021	26/06/2021	ML	175.00	HABITANTES	78	100.00%	102.44%	\$284,098.84	
44	82640	C-SOP-022/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE PRIV LA PAZ ENTRE DR. A MATIENZO Y DR. ALFONSO G ALARCON ZONA CENTRO	\$849,921.11	\$849,921.11	29/03/2021	26/06/2021	ML	175.00	HABITANTES	78	100.00%	99.40%	\$844,807.54	
45	82661	C-SOP-022/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV LA PAZ ENTRE DR. A MATIENZO Y DR. ALFONSO G ALARCON ZONA CENTRO	\$1,200,131.71	\$1,200,131.71	29/03/2021	26/06/2021	M2	535.50	HABITANTES	78	100.00%	100.45%	\$1,205,498.11	

RAMO 033  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021**


PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2021		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
46	82683	C-SOP-022/2021	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV LA PAZ ENTRE DR. A MATIENZO Y DR. ALFONSO G ALARCON ZONA CENTRO	\$138,848.20	\$138,848.20	29/03/2021	26/06/2021	ML	175.00	HABITANTES	78	100.00%	94.56%	\$131,292.08	
47	178336	C-SOP-023/2021	TAMPICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE TOPILTZIN ENTRE BENITO JUAREZ Y AV. AYUNTAMIENTO COL.TRUEBA	\$1,574,745.98	\$1,574,745.98	29/03/2021	17/05/2021	ML	120.50	HABITANTES	68	100.00%	92.29%	\$1,453,306.27	
48	214103	C-SOP-032/2021	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN MUELLE TANCOL EN CALLE RIVERA ENTRE CHAIREL Y PRIV AGUILA COL TANCOL	\$2,620,734.86	\$2,620,734.86	05/07/2021	02/09/2021	ML	147.00	HABITANTES	87	100.00%	0.00%	\$2,509,152.04	
49	215814	C-SOP-032/2021	TAMPICO	URBANIZADORA AZTECA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE MURO DE CONTENCIÓN EN MUELLE TANCOL EN CALLE RIVERA ENTRE CHAIREL Y PROV AGUILA COL TANCOL	\$220,842.91	\$220,842.91	05/07/2021	02/09/2021	ML	147.00	HABITANTES	44	100.00%	0.00%	\$0.00	
50	216022	C-SOP-033/2021	TAMPICO	MOVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE AV LAS TORRES SUR Y PRIV LAS JAIBAS COL LAS TORRES	\$798,256.12	\$798,256.12	09/08/2021	22/09/2021	M2	564.06	HABITANTES	44	90.00%	0.00%	\$0.00	
51	216223	C-SOP-S-005/2021	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REENCARPETADO AL PASO A DESNIVEL EN AVE HIDALGO Y AVE VALLES	\$2,545,023.47	\$2,545,023.47	09/08/2021	22/09/2021	M2	10,500.00	HABITANTES	966	100.00%	0.00%	\$0.00	
52	114080		TAMPICO		GASTOS INDIRECTOS: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	01/04/2021	30/09/2021	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	N/A	N/A	100.00%	100.00%	\$1,200,000.00	
<b>TOTAL EN OBRA:</b>						<b>\$33,792,361.34</b>	<b>\$39,943,484.80</b>										<b>\$33,792,361.34</b>
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM):</b>						<b>\$0.00</b>											
<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>						<b>\$1,200,000.00</b>											
<b>TOTAL:</b>						<b>\$34,992,361.34</b>											
<b>TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:</b>						<b>\$41,761,252.00</b>											
<b>SIN PROGRAMAR:</b>						<b>\$1,817,767.20</b>											
<b>SIN EJERCER:</b>						<b>\$7,968,890.66</b>											

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH  
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

SÍNDICO MUNICIPAL  
  
LIC. JOSE LUIS SANCHEZ GARZA  
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS  
  
L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI  
SECRETARIA DE FINANZAS  
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA  
  
LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIAGA  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
  
ING. PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
