



RAMO 033

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023



PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC		
1	142960	C-SOP-001/2023	TAMPICO	IEX SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA PLAZA DE LAS ARTES	\$1,935,768.07	\$1,935,768.07			27/03/2023	14/04/2023	M2	3,943.79	HABITANTES	99	100.00%	100.00%	\$1,935,768.07
2	144903	C-SOP-002/2023	TAMPICO	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO PARA INFRAESTRUCTURA DEL TRAMO 3 DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO BLVD FIDEL VELAZQUEZ COL ANAHUAC	\$448,372.81	\$448,372.81			27/03/2023	14/04/2023	ML	66.76	HABITANTES	198	100.00%	100.00%	\$448,372.81
3	178823	C-SOP-004/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE VADO EN BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE XICOTENCATL Y MATAMOROS COL GUADALUPE MAINERO	\$270,471.72	\$270,471.72			26/04/2023	24/06/2023	M2	245.92	HABITANTES	206	100.00%	0.00%	\$0.00
4	180975	C-SOP-004/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN BLVD LOPEZ MATEOS ENTRE VICENTE GUERRERO Y RAMOS ARIZPE COL OBRERA	\$115,081.60	\$115,081.60			26/04/2023	24/06/2023	M2	58.55	HABITANTES	143	100.00%	0.00%	\$0.00
5	181472	C-SOP-004/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE SOR JUANA I CRUZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL NUEVO PROGRESO	\$234,331.05	\$234,331.05			26/04/2023	24/06/2023	M2	113.22	HABITANTES	145	100.00%	0.00%	\$0.00
6	181811	C-SOP-004/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CRUCERO EN CALLE FRANCIA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO	\$212,629.56	\$212,629.56			26/04/2023	24/06/2023	M2	97.18	HABITANTES	478	100.00%	0.00%	\$0.00
7	184037	C-SOP-005/2023	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE MERCADO DE LA PUNTILLA EN CALLE BORDO DE PROTECCION ENTRE PRIV LA PAZ Y REFORMA COL CASCAJAL	\$489,623.63	\$489,623.63			18/05/2023	01/07/2023	ML	411.00	HABITANTES	732	100.00%	100.87%	\$493,867.71
8	185575	C-SOP-005/2023	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE MERCADO DE LA PUNTILLA EN CALLE BORDO DE PROTECCION ENTRE PRIV LA PAZ Y REFORMA COL CASCAJAL	\$1,210,307.81	\$1,210,307.81			18/05/2023	01/07/2023	ML	316.00	HABITANTES	732	100.00%	112.42%	\$1,360,680.70
9	185751	C-SOP-005/2023	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE JOAQUIN CASTILLA ENTRE PRIV LA PAZ Y PEDRO J MENDEZ COL CASCAJAL	\$169,941.77	\$169,941.77			18/05/2023	01/07/2023	M2	87.00	HABITANTES	732	100.00%	0.00%	\$0.00
10	186074	C-SOP-006/2023	TAMPICO	CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE FCO VILLA Y ALVARO OBREGON COL NUEVO PROGRESO	\$178,442.39	\$178,442.39			18/05/2023	15/08/2023	ML	167.70	HABITANTES	92	100.00%	126.21%	\$225,206.48
11	268902	C-SOP-006/2023	TAMPICO	CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE FCO VILLA Y ALVARO OBREGON COL NUEVO PROGRESO	\$696,418.00	\$696,418.00			18/05/2023	15/08/2023	ML	167.70	HABITANTES	92	100.00%	73.59%	\$512,464.03
12	186253	C-SOP-006/2023	TAMPICO	CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE FCO VILLA Y ALVARO OBREGON COL NUEVO PROGRESO	\$2,322,340.83	\$2,322,340.83			18/05/2023	15/08/2023	M2	1,003.14	HABITANTES	92	100.00%	96.33%	\$2,237,130.30
13	186324	C-SOP-006/2023	TAMPICO	CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE FCO VILLA Y ALVARO OBREGON COL NUEVO PROGRESO	\$193,737.76	\$193,737.76			18/05/2023	15/08/2023	ML	93.70	HABITANTES	92	100.00%	124.14%	\$240,513.02

*[Handwritten signatures and blue ink marks are present over the bottom portion of the table, including a large signature across rows 10-13 and another signature at the bottom right.]*

PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
14	187887	C-SOP-007/2023	TAMPICO	SEGURIV EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ACCESO SUR DE LA CIUDAD DEPORTIVA COL GUADALUPE MAINERO	\$2,550,813.82	\$2,550,813.82	20/05/2023	03/07/2023	M2	3,291.37	HABITANTES	299	100.00%	89.27%	\$2,277,228.61	
15	191610	C-SOP-008/2023	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE MIRAMAR ENTRE DEL MAR Y CAMINO VIEJO A TANCOL COL MIRADOR	\$403,830.39	\$403,830.39	05/06/2023	02/09/2023	ML	385.00	HABITANTES	105	100.00%	100.81%	\$407,092.30	
16	281699	C-SOP-008/2023	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MIRAMAR ENTRE DEL MAR Y CAMINO VIEJO A TANCOL COL MIRADOR	\$1,373,794.00	\$1,373,794.00	05/06/2023	02/09/2023	ML	381.00	HABITANTES	105	100.00%	77.94%	\$1,070,699.66	
17	193322	C-SOP-008/2023	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIRAMAR ENTRE DEL MAR Y CAMINO VIEJO A TANCOL COL MIRADOR	\$3,426,179.32	\$3,426,179.32	05/06/2023	02/09/2023	M2	1,514.70	HABITANTES	105	100.00%	101.93%	\$3,492,418.79	
18	193536	C-SOP-008/2023	TAMPICO	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE MIRAMAR ENTRE DEL MAR Y CAMINO VIEJO A TANCOL COL MIRADOR	\$360,977.05	\$360,977.05	05/06/2023	02/09/2023	ML	175.00	HABITANTES	105	100.00%	109.28%	\$394,470.86	
19	198331	C-SOP-009/2023	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV LAS TORRES ENTRE CALLE PALMA Y AV LAS TORRES COL DEL BOSQUE	\$2,078,516.19	\$2,078,516.19	05/06/2023	02/09/2023	M2	764.48	HABITANTES	27	0.00%	88.53%	\$1,840,046.71	
20	198438	C-SOP-009/2023	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV LAS TORRES ENTRE CALLE PALMA Y AV LAS TORRES COL DEL BOSQUE	\$265,475.30	\$265,475.30	05/06/2023	02/09/2023	ML	117.07	HABITANTES	27	100.00%	98.45%	\$261,349.35	
21	198553	C-SOP-009/2023	TAMPICO	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLAMBOYANES ENTRE PALMA Y FIN DE CALLE COL DEL BOSQUE	\$483,427.87	\$483,427.87	05/06/2023	02/09/2023	M2	211.36	HABITANTES	27	100.00%	129.54%	\$626,254.12	
22	198839	C-SOP-010/2023	TAMPICO	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$123,308.42	\$123,308.42	12/06/2023	09/09/2023	ML	93.25	HABITANTES	73	100.00%	102.46%	\$126,343.53	
23	199067	C-SOP-010/2023	TAMPICO	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$457,863.25	\$457,863.25	12/06/2023	09/09/2023	ML	93.25	HABITANTES	73	100.00%	112.46%	\$514,894.39	
24	199100	C-SOP-010/2023	TAMPICO	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$1,962,282.88	\$1,962,282.88	12/06/2023	09/09/2023	M2	909.38	HABITANTES	73	100.00%	88.03%	\$1,727,422.62	
25	199115	C-SOP-010/2023	TAMPICO	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$239,724.72	\$239,724.72	12/06/2023	09/09/2023	ML	81.25	HABITANTES	73	100.00%	0.00%	\$0.00	
26	204913	C-SOP-011/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES VIHULSA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$148,857.86	\$148,857.86	12/06/2023	09/09/2023	ML	153.05	HABITANTES	112	100.00%	0.00%	\$0.00	



RAMO 033

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023



PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
27	282180	C-SOP-011/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES VIHULSA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$597,375.00	\$597,375.00	12/06/2023	09/09/2023	ML	153.05	HABITANTES	112	100.00%	0.00%	\$0.00	
28	205688	C-SOP-011/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES VIHULSA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$2,068,645.06	\$2,068,645.06	12/06/2023	09/09/2023	M2	909.38	HABITANTES	112	100.00%	0.00%	\$0.00	
29	205760	C-SOP-011/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES VIHULSA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$174,873.60	\$174,873.60	12/06/2023	09/09/2023	ML	81.00	HABITANTES	112	100.00%	0.00%	\$0.00	
30	207633	C-SOP-012/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE AV TAMAULIPAS Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$232,838.92	\$232,838.92	19/06/2023	09/09/2023	ML	227.30	HABITANTES	121	100.00%	150.38%	\$350,147.89	
31	282358	C-SOP-012/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE AV TAMAULIPAS Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$848,818.00	\$848,818.00	19/06/2023	09/09/2023	ML	225.30	HABITANTES	121	100.00%	44.56%	\$378,220.44	
32	208024	C-SOP-012/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE AV TAMAULIPAS Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$1,854,329.01	\$1,854,329.01	19/06/2023	09/09/2023	M2	759.65	HABITANTES	121	50.00%	0.00%	\$0.00	
33	208068	C-SOP-012/2023	TAMPICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE AV TAMAULIPAS Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$213,306.76	\$213,306.76	19/06/2023	09/09/2023	ML	109.30	HABITANTES	121	0.00%	0.00%	\$0.00	
34	208252	C-SOP-013/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV COLOMBIA ENTRE CHILE Y PUERTO RICO COL LAS AMERICAS	\$133,333.52	\$133,333.52	26/06/2023	23/09/2023	ML	147.30	HABITANTES	73	100.00%	88.70%	\$118,269.41	
35	282486	C-SOP-013/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE PRIV COLOMBIA ENTRE CHILE Y PUERTO RICO COL LAS AMERICAS	\$579,312.00	\$579,312.00	26/06/2023	23/09/2023	ML	143.30	HABITANTES	73	100.00%	42.47%	\$246,006.12	
36	208479	C-SOP-013/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV COLOMBIA ENTRE CHILE Y PUERTO RICO COL LAS AMERICAS	\$981,548.94	\$981,548.94	26/06/2023	23/09/2023	M2	356.36	HABITANTES	73	95.00%	0.00%	\$0.00	
37	208528	C-SOP-013/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV COLOMBIA ENTRE CHILE Y PUERTO RICO COL LAS AMERICAS	\$124,349.90	\$124,349.90	26/06/2023	23/09/2023	ML	81.30	HABITANTES	73	100.00%	0.00%	\$0.00	
38	208549	C-SOP-014/2023	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MORELOS Y GUERRERO COL OBRERA	\$118,855.86	\$118,855.86	26/06/2023	23/09/2023	ML	78.90	HABITANTES	110	100.00%	102.22%	\$121,499.68	
39	208615	C-SOP-014/2023	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MORELOS Y GUERRERO COL OBRERA	\$391,937.10	\$391,937.10	26/06/2023	23/09/2023	ML	78.90	HABITANTES	110	100.00%	116.34%	\$455,975.13	



RAMO 033

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023



PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC		
40	208645	C-SOP-014/2023	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MORELOS Y GUERRERO COL OBRERA	\$1,503,497.34	\$1,503,497.34			26/06/2023	23/09/2023	M2	655.33	HABITANTES	110	40.00%	0.00%	\$0.00
41	210635	C-SOP-014/2023	TAMPICO	THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MORELOS Y GUERRERO COL OBRERA	\$185,530.05	\$185,530.05			26/06/2023	23/09/2023	ML	76.90	HABITANTES	110	0.00%	0.00%	\$0.00
42	284168	C-SOP-015/2023	TAMPICO	FPB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV COLOMBIA ENTRE PUERTO RICO Y REPUBLICA DE GUATEMALA COL LAS AMERICAS	\$208,415.00	\$208,415.00			04/07/2023	01/10/2023	ML	138.28	HABITANTES	172	100.00%	76.01%	\$158,415.13
43	284476	C-SOP-015/2023	TAMPICO	FPB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE PRIV COLOMBIA ENTRE PUERTO RICO Y REPUBLICA DE GUATEMALA COL LAS AMERICAS	\$725,650.00	\$725,650.00			04/07/2023	01/10/2023	ML	148.28	HABITANTES	172	100.00%	87.60%	\$635,650.59
44	284657	C-SOP-015/2023	TAMPICO	FPB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV COLOMBIA ENTRE PUERTO RICO Y REPUBLICA DE GUATEMALA COL LAS AMERICAS	\$1,342,325.76	\$1,342,325.76			04/07/2023	01/10/2023	M2	616.86	HABITANTES	172	100.00%	0.00%	\$0.00
45	285128	C-SOP-015/2023	TAMPICO	FPB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV COLOMBIA ENTRE PUERTO RICO Y REPUBLICA DE GUATEMALA COL LAS AMERICAS	\$298,940.00	\$298,940.00			04/07/2023	01/10/2023	ML	94.28	HABITANTES	172	100.00%	0.00%	\$0.00
46	286153	C-SOP-016/2023	TAMPICO	JOVA ARQUITECTURA +DISEÑO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$236,900.00	\$236,900.00			04/07/2023	01/10/2023	ML	162.10	HABITANTES	59	100.00%	66.05%	\$156,475.95
47	286221	C-SOP-016/2023	TAMPICO	JOVA ARQUITECTURA +DISEÑO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$603,700.00	\$603,700.00			04/07/2023	01/10/2023	ML	154.10	HABITANTES	59	100.00%	90.88%	\$548,672.48
48	286390	C-SOP-016/2023	TAMPICO	JOVA ARQUITECTURA +DISEÑO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$1,100,124.00	\$1,100,124.00			04/07/2023	01/10/2023	M2	586.19	HABITANTES	59	50.00%	0.00%	\$0.00
49	286493	C-SOP-016/2023	TAMPICO	JOVA ARQUITECTURA +DISEÑO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BENITO JUAREZ Y FCO VILLA COL NUEVO PROGRESO	\$194,160.00	\$194,160.00			04/07/2023	01/10/2023	ML	82.10	HABITANTES	59	0.00%	0.00%	\$0.00
50	287106	C-SOP-017/2023	TAMPICO	PROVINSUMEX S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV MONTERREY ENTRE LINARES Y TANGOL COL CAMPBELL	\$975,186.74	\$975,186.74			10/07/2023	07/09/2023	M2	332.01	HABITANTES	98	90.00%	44.44%	\$433,415.31
51	287215	C-SOP-017/2023	TAMPICO	PROVINSUMEX S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV MONTERREY ENTRE LINARES Y TANGOL COL CAMPBELL	\$258,820.00	\$258,820.00			10/07/2023	07/09/2023	ML	115.00	HABITANTES	98	70.00%	0.00%	\$0.00
52	313954	C-SOP-019/2023	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE REFORMA ENTRE MERCADO DE LA PUNTILLA Y DR ALFREDO GOCHICOA COL CASCAJAL	\$266,495.00	\$266,495.00			14/07/2023	11/09/2023	ML	137.00	HABITANTES	140	100.00%	42.02%	\$111,975.01

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the bottom portion of the table, including a large signature over row 49 and another over row 52.]*



RAMO 033

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023




PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
53	316383	C-SOP-019/2023	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE REFORMA ENTRE MERCADO DE LA PUNTILLA Y DR ALFREDO GOCHICOA COL CASCAJAL	\$525,078.00	\$525,078.00	14/07/2023	11/09/2023	ML	133.00	HABITANTES	140	100.00%	89.76%	\$471,305.18	
54	322150	C-SOP-019/2023	TAMPICO	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA ENTRE MERCADO DE LA PUNTILLA Y DR ALFREDO GOCHICOA COL CASCAJAL	\$950,500.00	\$950,500.00	14/07/2023	11/09/2023	M2	488.83	HABITANTES	140	100.00%	0.00%	\$0.00	
55	324768	C-SOP-020/2023	TAMPICO	CONSEER NSTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE CESAR LOPEZ DE LARA ENTRE OBREGON Y ALTAMIRA COL ZONA CENTRO	\$206,100.00	\$206,100.00	18/07/2023	15/09/2023	ML	184.00	HABITANTES	72	100.00%	0.00%	\$0.00	
56	325747	C-SOP-020/2023	TAMPICO	CONSEER NSTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CESAR LOPEZ DE LARA ENTRE OBREGON Y ALTAMIRA COL ZONA CENTRO	\$630,384.00	\$630,384.00	18/07/2023	15/09/2023	ML	178.00	HABITANTES	72	100.00%	0.00%	\$0.00	
57	326133	C-SOP-020/2023	TAMPICO	CONSEER NSTE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CESAR LOPEZ DE LARA ENTRE OBREGON Y ALTAMIRA COL ZONA CENTRO	\$1,295,230.00	\$1,295,230.00	18/07/2023	15/09/2023	M2	755.78	HABITANTES	72	100.00%	0.00%	\$0.00	
58	326520	C-SOP-021/2023	TAMPICO	COMERCIALIZADORA SURTAM S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE CESAR LOPEZ DE LARA ENTRE ALTAMIRA Y CARRANZA COL ZONA CENTRO	\$215,800.00	\$215,800.00	18/07/2023	15/09/2023	ML	184.30	HABITANTES	41	100.00%	0.00%	\$0.00	
59	326786	C-SOP-021/2023	TAMPICO	COMERCIALIZADORA SURTAM S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CESAR LOPEZ DE LARA ENTRE ALTAMIRA Y CARRANZA COL ZONA CENTRO	\$703,500.00	\$703,500.00	18/07/2023	15/09/2023	ML	180.30	HABITANTES	41	100.00%	67.46%	\$474,560.98	
60	326951	C-SOP-021/2023	TAMPICO	COMERCIALIZADORA SURTAM S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CESAR LOPEZ DE LARA ENTRE ALTAMIRA Y CARRANZA COL ZONA CENTRO	\$1,595,100.00	\$1,595,100.00	18/07/2023	15/09/2023	M2	817.24	HABITANTES	41	90.00%	0.00%	\$0.00	
61	347204	C-SOP-018/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE COLEGIO MILITAR Y PRIV LAS JAIBAS COL NIÑOS HEROES	\$326,945.00	\$326,945.00	10/07/2023	07/10/2023	ML	236.65	HABITANTES	195	100.00%	0.00%	\$0.00	
62	352107	C-SOP-018/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE COLEGIO MILITAR Y PRIV LAS JAIBAS COL NIÑOS HEROES	\$1,128,415.00	\$1,128,415.00	10/07/2023	07/10/2023	ML	217.65	HABITANTES	195	100.00%	0.00%	\$0.00	
63	352546	C-SOP-018/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE COLEGIO MILITAR Y PRIV LAS JAIBAS COL NIÑOS HEROES	\$2,211,565.26	\$2,211,565.26	10/07/2023	07/10/2023	M2	766.50	HABITANTES	195	20.00%	0.00%	\$0.00	
64	352649	C-SOP-018/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE COLEGIO MILITAR Y PRIV LAS JAIBAS COL NIÑOS HEROES	\$218,489.00	\$218,489.00	10/07/2023	07/10/2023	ML	146.65	HABITANTES	195	0.00%	0.00%	\$0.00	
65	353177	C-SOP-018/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE 13 DE SEPTIEMBRE Y PANUCO COL NIÑOS HEROES	\$93,880.00	\$93,880.00	10/07/2023	07/10/2023	ML	53.15	HABITANTES	70	100.00%	0.00%	\$0.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature over the bottom row and several other initials.

**PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	
66	353373	C-SOP-018/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE 13 DE SEPTIEMBRE Y PANUCO COL NIÑOS HEROES	\$291,556.00	\$291,556.00	10/07/2023	07/10/2023	ML	65.15	HABITANTES	70	100.00%	0.00%	\$0.00	
67	353748	C-SOP-018/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE 13 DE SEPTIEMBRE Y PANUCO COL NIÑOS HEROES	\$580,190.99	\$580,190.99	10/07/2023	07/10/2023	M2	211.10	HABITANTES	70	20.00%	0.00%	\$0.00	
68	353962	C-SOP-018/2023	TAMPICO	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV LAS JAIBAS ENTRE 13 DE SEPTIEMBRE Y PANUCO COL NIÑOS HEROES	\$99,470.00	\$99,470.00	10/07/2023	07/10/2023	ML	39.15	HABITANTES	70	0.00%	0.00%	\$0.00	
69	356717	C-SOP-022/2023	TAMPICO	INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE ANDADOR 4 ENTRE ALVARO OBREGON Y BENITO JUAREZ COL EMILIO PORTES GIL	\$468,422.00	\$468,422.00	20/07/2023	17/10/2023	ML	287.00	HABITANTES	102	100.00%	87.47%	\$409,722.07	
70	357247	C-SOP-022/2023	TAMPICO	INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ANDADOR 4 ENTRE ALVARO OBREGON Y BENITO JUAREZ COL EMILIO PORTES GIL	\$942,443.00	\$942,443.00	20/07/2023	17/10/2023	ML	287.00	HABITANTES	102	100.00%	69.19%	\$652,088.04	
71	357606	C-SOP-022/2023	TAMPICO	INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANDADOR 4 ENTRE ALVARO OBREGON Y BENITO JUAREZ COL EMILIO PORTES GIL	\$1,466,102.56	\$1,466,102.56	20/07/2023	17/10/2023	M2	534.48	HABITANTES	102	40.00%	0.00%	\$0.00	
72	358227	C-SOP-022/2023	TAMPICO	INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ANDADOR 4 ENTRE ALVARO OBREGON Y BENITO JUAREZ COL EMILIO PORTES GIL	\$278,358.00	\$278,358.00	20/07/2023	17/10/2023	ML	141.00	HABITANTES	102	0.00%	0.00%	\$0.00	
73	362460	C-SOP-023/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE INTEGRACION SOCIAL Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$225,500.00	\$225,500.00	20/07/2023	17/10/2023	ML	179.00	HABITANTES	74	100.00%	0.00%	\$0.00	
74	362692	C-SOP-023/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE INTEGRACION SOCIAL Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$463,681.00	\$463,681.00	20/07/2023	17/10/2023	ML	163.00	HABITANTES	74	100.00%	0.00%	\$0.00	
75	394643	C-SOP-023/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE INTEGRACION SOCIAL Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$1,321,400.00	\$1,321,400.00	20/07/2023	17/10/2023	M2	706.10	HABITANTES	74	50.00%	0.00%	\$0.00	
76	377046	C-SOP-023/2023	TAMPICO	GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ANDADOR MUNICIPAL ENTRE INTEGRACION SOCIAL Y ARQ TORRES MIRANDA COL REVOLUCION VERDE	\$320,000.00	\$320,000.00	20/07/2023	17/10/2023	ML	102.30	HABITANTES	74	0.00%	0.00%	\$0.00	
77	383186	C-SOP-024/2023	TAMPICO	ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE PRIV SAN MIGUEL ENTRE SATURNO Y FIN DE CALLE COL BARANDILLAS	\$140,000.00	\$140,000.00	07/08/2023	05/10/2023	ML	101.00	HABITANTES	125	100.00%	43.19%	\$60,467.99	
78	383991	C-SOP-024/2023	TAMPICO	ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE PRIV SAN MIGUEL ENTRE SATURNO Y FIN DE CALLE COL BARANDILLAS	\$299,950.00	\$299,950.00	07/08/2023	05/10/2023	ML	96.00	HABITANTES	125	100.00%	45.73%	\$137,172.34	

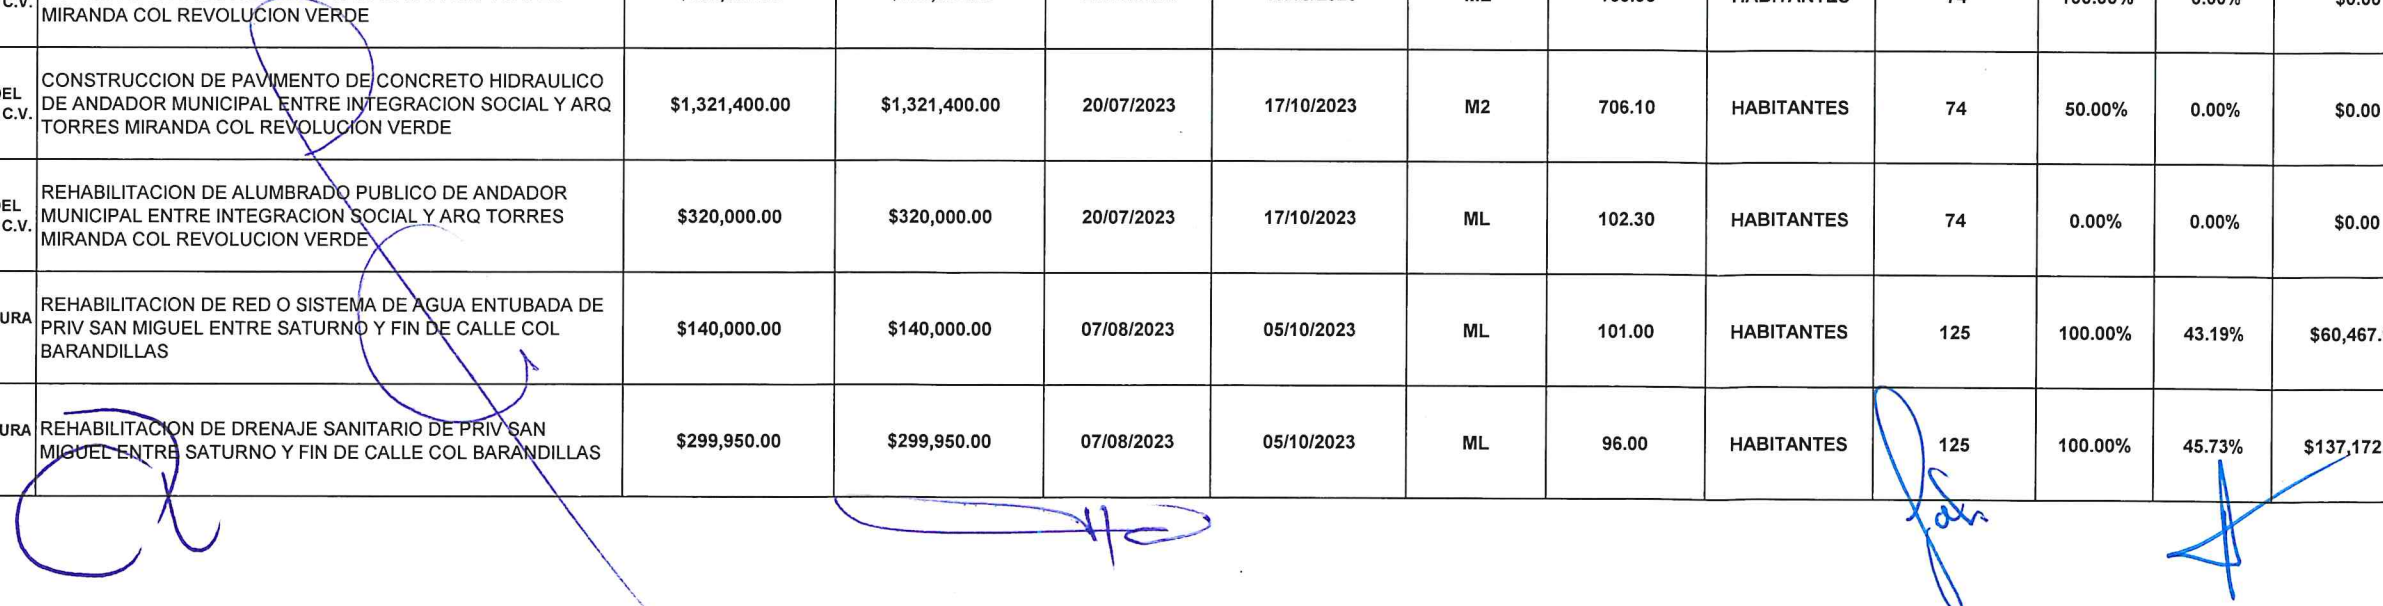

**PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

No. DE OBRA	No. CLAVE MIDS	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO BASE	INVERSION ASIGNADA EN EL 2023		FECHAS		METAS		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
							FEDERAL		INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC	FINANCIERA
79	384830	C-SOP-024/2023	TAMPICO	ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV SAN MIGUEL ENTRE SATURNO Y FIN DE CALLE COL BARANDILLAS	\$580,000.00	\$580,000.00		07/08/2023	05/10/2023	M2	180.00	HABITANTES	125	50.00%	0.00%	\$0.00
80	384450	C-SOP-024/2023	TAMPICO	ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV SAN MIGUEL ENTRE SATURNO Y FIN DE CALLE COL BARANDILLAS	\$212,248.68	\$212,248.68		07/08/2023	05/10/2023	ML	60.00	HABITANTES	125	0.00%	0.00%	\$0.00
81	44771 - 48835	NA	TAMPICO	NA	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	\$1,185,694.00	\$1,185,694.00		01/07/2023	31/12/2023	UNIDAD	EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO	NA	NA	0.00%	0.00%	\$0.00
<b>TOTAL EN OBRA:</b>						\$56,362,094.12	\$57,547,788.12										\$26,112,263.80
<b>PRODIM:</b>						\$1,185,694.00											
<b>TOTAL:</b>						\$57,547,788.12											
<b>TECHO FINANCIERO MUNICIPAL:</b>						\$59,327,616.00											
<b>SIN PROGRAMAR:</b>						\$1,779,827.88											
<b>SIN EJERCER:</b>						\$33,215,352.20											

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH

SÍNDICO MUNICIPAL  
  
 ING. JOSE LUIS SANCHEZ GARZA  
 TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE FINANZAS  
  
 L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA  
  
 LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIAGA  
 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
 TAMPICO, TAM.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS  
  
 ING. PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO  
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 TAMPICO, TAM.

*feh*
